

PROJEKTMANAGEMENT SS26



LOOP STUDIO

F A S H I O N

Emilia Renn, 5028722

Nives Nikolić, 5028603

Paula Genth, 5028796

Paulina Müller, 5027204

Johanna Klein, 5029194

Marie Pleick, 5029064

GLIEDERUNG

1. Einleitung	
1.1 Unternehmens-Sachverhalt	3
1.1.1 SWOT-Analyse	4
1.2 Gruppenzusammensetzung	6
2. Projektkontext	
2.1 Projektauftrag mit Zielen	7
2.2 Kommunikationsplan	9
2.2.1 Stakeholder- Analyse	9
2.3 Ziele und Risiken	12
3. Projektplanung	
3.1 Strukturplanung	13
3.2 Aufwandsplanung	14
3.3 Ablaufplanung	15
3.4 Ressourcenplanung	16
3.5 Kostenplanung - Soll	19
4. Webseite	22

UNTERNEHMENS-SACHVERHALT

1. Name des Unternehmens

“Loop Studio”

2. Claim / Vision

Unser Unternehmen legt Wert darauf Mode nachhaltig zu gestalten, indem wir Kleidungsstücken ein zweites Leben schenken, damit Frauen stilvoll aber auch umweltbewusst einkaufen können.

3. Projektteam

Paula Genth, Paulina Müller, Marie Pleick, Johanna Klein, Emilia Renn, Nives Nikolić

4. Was bieten wir an?


Unser Online-Shop für Premium-Secondhand Kleidung zeigt Produkte mit Bildern und Beschreibungen, bietet Auswahl nach Kategorien, ermöglicht den Kauf über den Warenkorb, wickelt Zahlungen ab und organisiert Versand sowie Rückgabe.

5. Wie groß ist das Unternehmen?

Das Unternehmen agiert deutschlandweit und beschäftigt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in verschiedenen Bereichen tätig sind.

6. Welche organisatorische Struktur liegt vor?

Das Unternehmen ist linear organisiert, da die verschiedenen Abteilungen klar voneinander getrennt sind und jeweils ihre eigenen Aufgaben erfüllen. Dadurch sind die Verantwortlichkeiten ebenfalls eindeutig geregelt, was zu einer erleichterten Koordination und klaren Kommunikationswegen führt.

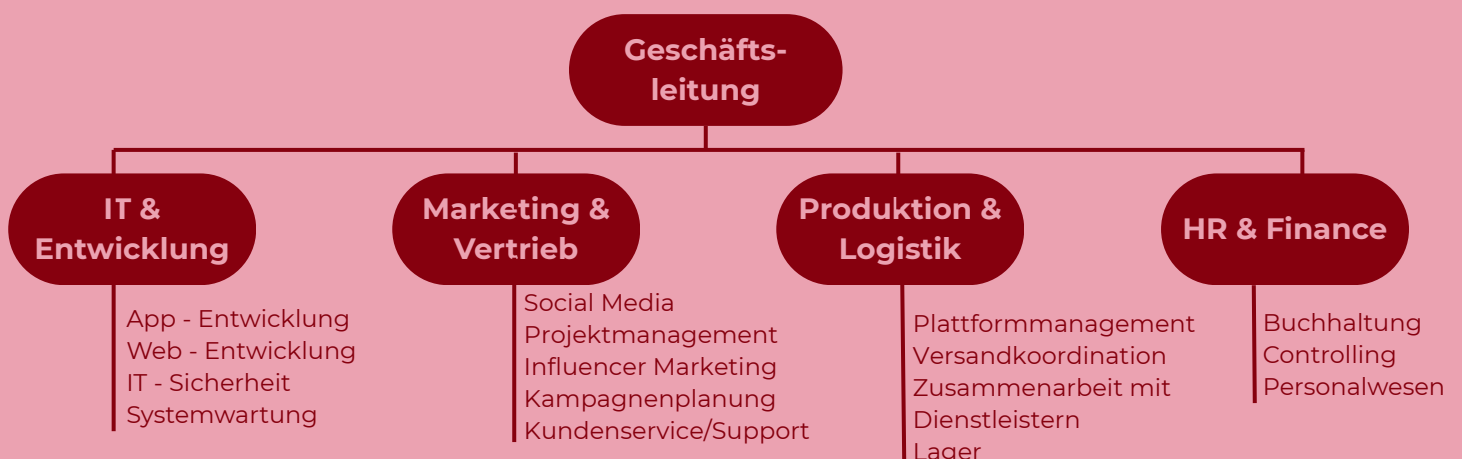

SWOT-ANALYSE

STRENGTHS

1. Breites und abwechslungsreiches Sortiment an Second-Hand-Artikeln
2. Bestehender Kundenstamm mit hoher Wiederkauftrate
3. Kundenorientierter Service mit hoher Zufriedenheit
4. Schnelle und zuverlässige Lieferung

WEAKNESSES

1. Abhängigkeit von Waren der Einsender:innen: Fehlen Einsendungen, fehlt das Sortiment
2. Starke interne Abhängigkeit zwischen den Abteilungen
3. Abhängigkeit von externen Versanddienstleistern – Risiko durch Lieferverzögerungen oder Warenverlust

OPPORTUNITIES

1. Wachsender Online-Shopping-Markt durch veränderte Konsumgewohnheiten
2. Steigendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit und wachsende Nachfrage nach Second-Hand- und Vintage-Mode

THREATS

1. Starke Konkurrenz durch etablierte Wettbewerber
2. Wirtschaftliche Lage beeinflusst das Kaufverhalten und die Konsumbereitschaft der Kund:innen

PROJEKTIDEEN

- *Pop-up-Store*: Eröffnung eines temporären Ladens, um das Sortiment offline anzubieten und neue Kund:innen zu gewinnen.
- *KI-Tool*: Entwicklung eines KI-gestützten Empfehlungssystems, das das breite Sortiment optimal für den wachsenden Online-Shopping-Markt nutzbar macht.
- *Fashionshow*: Veranstaltung einer Modenschau, um das vielfältige Sortiment zu präsentieren und sich von der starken Konkurrenz abzuheben.
- *GNTM-Kooperation*: Zusammenarbeit mit Germany's Next Topmodel zur Steigerung der Markenbekanntheit und Gewinnung neuer Zielgruppen.

SWOT-ANALYSE

Maßnahmenoptionen - Ableitung aus der SWOT-Analyse

SO-Strategien (Stärken nutzen um Chancen zu ergreifen)

- Das breite Second-Hand-Sortiment und der bestehende Kundenstamm werden genutzt um durch einen Pop-Up-Store neue Kund:innen direkt vor Ort anzusprechen und den wachsenden Second-Hand-Trend zu bedienen
- Der gute Kundenservice wird ausgebaut um die steigende Nachfrage nach nachhaltigem Einkaufen gezielt anzusprechen

ST-Strategien (Stärken nutzen um Bedrohungen abzuwehren)

- Durch schnelle Lieferung und hohen Kundenservice wird die Kundenbindung gestärkt um sich von etablierten Wettbewerbern wie Vinted abzuheben
- Der bestehende Kundenstamm wird durch Treueprogramme oder Rabattaktionen gehalten um wirtschaftliche Schwankungen abzufedern

WO-Strategien (Chancen nutzen um Schwächen zu reduzieren)

- Durch gezielte Social-Media-Kampagnen werden mehr Einsender:innen gewonnen um die Abhängigkeit vom Wareneingang zu reduzieren
- Der wachsende Online-Shopping-Markt wird genutzt um die interne Abteilungscoordination durch digitale Tools zu verbessern

WT-Strategien (Schwächen und Bedrohungen minimieren)

- Alternative Versandpartner werden geprüft um die Abhängigkeit von einzelnen Dienstleistern zu reduzieren und Lieferprobleme zu minimieren
- Durch klare interne Kommunikationsstrukturen wird die Abteilungsabhängigkeit reduziert um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten effizient zu arbeiten

→ Nach Abwägung aller Optionen hat sich das Team für die Umsetzung des Pop-Up-Stores entschieden, da dieser sowohl den wachsenden Second-Hand-Trend als auch die Stärken des bestehenden Sortiments und des Kundenstamms am besten nutzt.

GRUPPENZUSAMMENSETZUNG

Projektteam - Pop-up-Store

Nives Nikolić	Projektleitung Gesamtverantwortung, Organisation, Zeitplanung, Koordination, Stakeholdermanagement
Paulina Müller	Finanzen & Controlling Budgetplanung, Kostenkontrolle, Finanzielle Auswertung, Liquiditätssicherung
Paula Genth	Recht & Standort Standortplanung, rechtliche Angelegenheiten (Verträge, Gewerbebeanmeldung), Risikoplanung
Marie Pleick	Personal & Organisation Personalplanung, Team-Briefing, Koordination von externem Personal
Johanna Klein	Marketing & Kommunikation Marketingstrategie, Social-Media-Kampagne, Werbung, Storesdesign & Kundenerlebnis
Emilia Renn	Einkauf & Logistik Ware & Sortiment, Logistik & Technik, Koordination von Lieferungen

PROJEKTAUFTRAG - LOOP STUDIO

Projektname	Pop-up-Store
Auftraggeber:in	Ante Hamersmit
Datum	15.4.2026

Kostenstelle	12345
Projektleiter:in	Nives Nikolić
Unterschrift AG	

Ausgangslage

Online-Shop für Premium-Secondhand Kleidung

Projektziel

Eröffnung eines Pop-up-Stores

Projektnutzen

Neue Kundschaft, direktes Einkaufserlebnis, Umsatzsteigerung, Werbeeffect, Markttest, Markenbekanntheit, Imageaufbau, Sortimentsoptimierung, Datensammlung

Terminierung

Projektdauer: 15.04.26 - 09.06.2027

Pop-up-Store Öffnung: 21.04.27 - 19.05.2027

Chancen

&

Risiken

- **Umsatzsteigerung** durch zusätzlichen Verkaufskanal
- **Erhöhung der Markenbekanntheit** und Sichtbarkeit vor Ort
- **Direkter Kundenkontakt** und persönliches Feedback
- **Gewinnung neuer Kund:innen** und Aufbau einer Stammkundschaft
- **Testen eines Standorts** oder eines stationären Geschäfts
- **Stärkung des Markenimages** (z. B. nachhaltig, individuell)
- **Hohe Kosten** für Miete, Einrichtung und Personal
- **Unsichere Nachfrage** und mögliche geringe Besucherzahlen
- **Organisationsaufwand** und Zeitbelastung
- **Wetter oder Lage** können Kundenzahl beeinflussen
- **Restbestände** können übrig bleiben
- **Kurzfristiger Charakter** → Erfolg nicht garantiert

Projektteam

Emilia Renn, Nives Nikolić, Paula Genth, Paulina Müller, Johanna Klein, Marie Pleick

PROJEKTAUFTRAG - LOOP STUDIO

Projektname	Pop-up-Store
Auftraggeber:in	Ante Hamersmit
Datum	15.4.2026

Kostenstelle	12345
Projektleiter:in	Nives Nikolić
Unterschrift AG	

Benötigte Mittel

Sachliche Mittel

- **Verkaufsausstattung** (Kleiderständer, Regalsysteme, Spiegel, Kassentheke, Dekoration, Umkleidekabinen, Sitzmöglichkeiten, Verpackung, Preisschilder)
- **Technik** (Kassensystem, Kartenlesegerät, Tablet, WLAN, Lautsprecher, Beleuchtung, Stromversorgung)
- **Ware** (Kleidungskollektion, Accessoires, Lagerbestand & Nachfüllware)

Finanzielle Mittel

- **Einmalige Kosten (gesamt ca. 57.000€):** Verkaufsausstattung · Technik · Branding & Dekoration · Transport & Aufbau · Marketing · Kautions · Risiko
- **Laufende Kosten (gesamt ca. 473.000€):** Kaltmiete · Nebenkosten · Personal · Betriebskosten · Versicherung
- **Gesamtkosten Pop-up-Store: ca. 530.000€**

(Personalkosten sind als Arbeitgeberbrutto ausgewiesen (Bruttogehalt zzgl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung ca. 20%). Sachkosten sind Nettobeträge ohne MwSt.)

Räumliche Mittel

- Verkaufs- & Lagerfläche, Personalbereich

Personelle Mittel

- Projektteam (Organisation, Finanzen, Zeitplanung, Betreuung)
- Verkaufspersonal (Beratung, Verkauf, Kasse)
- Auf-/Abbauhelfer:innen
- Social-Media-Betreuung
- Reinigungskraft

Arbeitszeit

- **Planung (26 Wochen)**

Konzept & Strategie, Standortplanung, Finanzen & Controlling, Rechtliches, Personalplanung, Marketingstrategie

- **Vorbereitung (26 Wochen)**

Ware & Sortiment, Storesdesign & Kundenerlebnis, Marketing, Logistik & Technik, Risikoplanung

- **Aufbau (1 Woche)**

Store Einrichtung, Atmosphäre & Erlebnis, Technik & Prozesse, Team-Briefing

- **Durchführung (4 Wochen)**

Verkauf & Kundenkontakt, Store Management, Marketing, Controlling, Personal

- **Nachbereitung (3 Wochen)**

Abbau & Logistik, Finanzielle Auswertung, Analyse & Learnings, Weiterverwertung

KOMMUNIKATIONSPLAN

1 Stakeholder Analyse

Einfluss



KOMMUNIKATIONSPLAN

2 Kommunikationsplan - Teil I

Stakeholder	Kommunikationsziel	Inhalt	Kanal	Häufigkeit	Verantwortlich
Auftraggeber	Informieren & einbinden	Statusberichte, Meilensteine, Budgetübersicht	E-Mail, persönliche Meetings	Monatlich bis wöchentlich	Projektleitung
Geschäftsleitung	Informieren & einbinden	Projektfortschritt, strategische Entscheidungen	Meetings, Berichte	Monatlich	Projektleitung
Projektteam (intern)	Koordinieren	Aufgabenstatus, Fortschritt, Feedback	Meetings, E-Mail, Nachrichten auf Teams	Wöchentlich bis täglich	Projektleitung
Einsender:innen	Informieren & koordinieren	Annahmekonditionen, Versandinfos, Auszahlung	E-Mail, Social Media, Website	Bei Bedarf	Marketing & Vertrieb
Behörden / Genehmigungen	Zufriedenstellen	Genehmigungen, gesetzliche Anforderungen, Fristen	Formeller Schriftverkehr	Bei Bedarf	Projektteam
HR / Finance	Informieren	Personalplanung, Budgetkontrolle, Abrechnung	E-Mail, interne Berichte	Monatlich	Projektleitung
Vermieter der Ladenfläche	Absprechen, Koordinieren	Mietvertrag, Auf- & Abbauzeiten, Sonderwünsche, Rückfragen	E-Mail, persönlich	Bei Bedarf	Projektleitung

KOMMUNIKATIONSPLAN

2 Kommunikationsplan - Teil II

Stakeholder	Kommunikationsziel	Inhalt	Kanal	Häufigkeit	Verantwortlich
Öffentlichkeit / Medien	Informieren	Ankündigung, Pressemitteilungen, Events	Instagram, Website, Pressemitteilung	Vor & während Pop-up-Stores	Marketing & Vertrieb
Dienstleister	Informieren	Lieferzeiten, Leistungsanforderungen, Absprachen	E-Mail, Telefon	Bei Bedarf	Produktion & Logistik
Produktion & Logistik	Koordinieren & informieren	Lagerorganisation, Versandplanung, Auf-/Abbau des Stores	Meetings, E-Mail	Wöchentlich	Projektteam
Marketing & Vertrieb	Koordinieren & einbinden	Kampagnenplanung, Social Media, Aktionen	Teams, Meetings	Wöchentlich	Projektteam
Käufer:innen / Zielgruppe	Informieren, ansprechen & gewinnen	Ankündigung, Aktionen	Social Media, Website	Mehrmals wöchentlich	Marketing & Vertrieb
Angestellte im Pop-up-Store	Informieren & koordinieren	Aufgaben, Arbeitszeiten	Persönlich, Meetings, E-Mail	Täglich (während des Pop-up-Stores)	Projektteam

Wettbewerber und Projektleitung werden in der Stakeholder-Analyse berücksichtigt, fehlen jedoch im Kommunikationsplan. Mit Wettbewerbern kommunizieren wir nicht aktiv, sondern beobachten sie und werden von ihnen beobachtet. Die Projektleitung ist Teil des Projektteams und daher Bestandteil der internen Kommunikation.

ZIELE UND RISIKEN

1 SMART - Ziele

Im geöffneten Zeitraum sollen mindestens 1.500 Kunden den Store besuchen.

- Klar definierter Zeitraum, Fokus auf Kundenfrequenz im Pop-up-Store, realistisches und überprüfbares Besucherziel
- KPI: Anzahl der Besucher

Die Instagram-Followerzahl von Loop Studio soll bis zum Ende des Öffnungszeitraums des Pop-up-Stores um 12% steigen.

- Ziel zur Steigerung der Markenbekanntheit und Online-Reichweite, prozentuale Veränderung eindeutig messbar, zeitlich begrenzt
- KPI: Prozentuales Follower-Wachstum

Bis zum 15.04.2027 mindestens 300 neue Newsletter-Anmeldungen generieren.

- Fokus auf Neukundengewinnung und Kundenbindung, konkrete Anzahl und feste Deadline
- KPI: Anzahl neuer Anmeldungen

Der Pop-up-Store soll innerhalb von 4 Wochen einen Umsatz von 45.000€ erzielen.

- Wirtschaftliches Hauptziel des Projekts, klar definierter Umsatzwert und Zeitraum, realistisch basierend auf Besucheranzahl und Durchschnittsumsatz
- KPI: Umsatz in Euro

2 Risiken

Risiko	Relevante Attribute	Eintritts wahrscheinlichkeit	Gegenmaßnahmen
geringe Besucherzahlen	Besucheranzahl, Umsatz	mittel	stärkere Werbung und Influencer-Marketing
hohe Kosten	Budget, Gewinn	hoch	genaues Budgetmanagement
Lieferprobleme/ verspätete Ware	Lieferzeit, Warenbestand	niedrig – mittel	Frühzeitige Planung und Ersatzlieferanten
Personalausfall	Mitarbeiteranzahl, Servicequalität	niedrig – mittel	Reservepersonal einplanen
schlechter Standort / geringe Sichtbarkeit	Laufkundschaft, Sichtbarkeit	mittel	gute Standortanalyse vor Vertragsabschluss
Personalengpass in der Aufbauphase	Zeitplan, Storeeinrichtung	mittel	zusätzliche Aufbauhelfer reservieren, frühzeitige Kommunikation

STRUKTURPLANUNG

Phasenorientierte Strukturplanung



AUFWANDSPLANUNG

Top-Down

Projektphase	Anteil (%)	Dauer (Wochen)
Planung	43,3%	26
Vorbereitung	43,3%	26
Aufbauphase	1,7%	1
Durchführungsphase	6,7%	4
Nachbereitungsphase	5%	3
Gesamt	100%	60 Wochen

Für die Aufwandsplanung des Pop-Up-Stores wurde die Top-Down-Methode gewählt. Da der Auftraggeber eine Gesamtprojektdauer von 60 Wochen vorgegeben hat, wurde diese zunächst auf die fünf Projektphasen aufgeteilt: Planung, Vorbereitung, Aufbau, Durchführung und Nachbereitung.

Die größten Zeitanteile entfallen auf die Planungs- und Vorbereitungsphase, da diese den Großteil der organisatorischen und strategischen Vorarbeit umfassen. Die Aufbauphase ist bewusst kurz gehalten, da sie rein operativer Natur ist. Die Durchführungsphase entspricht dem eigentlichen Öffnungszeitraum des Pop-Up-Stores von 4 Wochen. Die Nachbereitungsphase umfasst Abbau, Auswertung und Analyse der gewonnenen Erkenntnisse.

Innerhalb jeder Phase laufen die einzelnen Aufgaben und Arbeitspakete parallel zueinander. Die Gesamtdauer einer Phase ergibt sich daher nicht aus der Summe aller Aufgaben, sondern aus der längsten Einzelaufgabe innerhalb dieser Phase.

ABLAUFPLANUNG

Aktivität	Startwoche	Dauer in Wochen	Woche																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Phase 1: Planung	1	26																										
Konzept & Strategie	1	8																										
Standortplanung	9	4																										
Finanzen & Controlling	13	4																										
Rechtliches	17	2																										
Personalplanung	19	4																										
Marketingstrategie	23	4																										

Aktivität	Startwoche	Dauer in Wochen																										
			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Phase 2: Vorbereitung	27	26																										
Ware & Sortiment	27	18																										
Marketing	27	25																										
Logistik & Technik	27	18																										
Risikoplanung	27	18																										
Storedesign & Kundenerlebnis	45	8																										

Aktivität	Startwoche	Dauer in Wochen	53
Phase 3: Aufbauphase	53	1	
Store Einrichtung	53	1	
Atmosphäre & Erlebnis	53	1	
Technik & Prozesse	53	1	
Team-Briefing	53	1	

Aktivität	Startwoche	Dauer in Wochen	54	55	56	57
Phase 4: Durchführung	54	4				
Verkauf & Kundenkontakt	54	4				
Store Management	54	4				
Marketing	54	4				
Controlling	54	4				
Personal	54	4				

Aktivität	Startwoche	Dauer in Wochen	58	59	60
Phase 5: Nachbereitungsphase	58	2			
Abbau & Logistik	58	1			
Finanzielle Auswertung	59	1			
Analyse & Learnings	59	2			
Weiterverwertung	60	1			

RESSOURCENPLANUNG

Planungsphase

Vorgang	Vorgänger	Dauer	Ressourcenbedarf	Dauer/ Wochen
Konzept & Strategie		8	Finanzielle Mittel: - Rechtsberatungskosten, erste Anzahlungen (z.B. Location), Gehälter Personelle Mittel: - Projektteam (6 Personen) - Qualifikationen: strategisches Denken, BWL-Kenntnisse, rechtliches Grundwissen, Organisationstalent Arbeitszeit: 26 Wochen	1-8
Standortplanung	Konzept & Strategie	4		9-12
Finanzen & Controlling	Standortplanung	4		13-16
Rechtliches	Finanzen & Controlling	2		17-18
Personalplanung	Rechtliches	4		19-22
Marketingstrategie	Personalplanung	4		23-26

Vorbereitungsphase

Ware & Sortiment		18	Sachliche Mittel: - Ware, Verpackungsmaterial, Technik, Verkaufsausstattung Finanzielle Mittel: - Technikkosten, Miete & Kautiion, Marketingkosten, Gehälter Räumliche Mittel: - Ladenfläche Personelle Mittel: - Projektteam (6 Personen) - Qualifikationen: Einkauf/Sortiment-Kenntnisse, Marketing-Kenntnisse, technisches Verständnis - Social Media Betreuung (1 Person) - Qualifikationen: Content-Erstellung, Community Management Arbeitszeit: 25 Wochen	27-44
Marketing		25		27-52
Logistik & Technik		18		27-44
Risikoplanung		18		27-44
Storedesign & Kundenerlebnis	Ware & Sortiment	8		45-52

RESSOURCENPLANUNG

Aufbauphase

Vorgang	Vorgänger	Dauer	Ressourcenbedarf	Woche
Store Einrichtung		1	Sachliche Mittel: - Verkaufsausstattung, Dekoration, Technik Finanzielle Mittel: - Logistikkosten, Miete, Nebenkosten, Gehälter Räumliche Mittel: - Ladenfläche Personelle Mittel: - Projektteam (6 Personen) – Qualifikation: Organisation, Koordination, - Aufbauhelfer (3 Personen) – Qualifikation: handwerkliches Geschick, Möbelaufbau Arbeitszeit: 1 Woche	53
Atmosphäre & Erlebnis		1		53
Technik & Prozesse		1		53
Team-Briefing		1		53

Durchführungsphase

Verkauf & Kundenkontakt		4	Sachliche Mittel: - Ware, Verpackungsmaterial, Kassensystem, Verkaufsausstattung Finanzielle Mittel: - Miete, Nebenkosten, Gehälter, Versicherung Räumliche Mittel: - Ladenfläche Personelle Mittel: - Projektteam (6 Personen) – Qualifikation: Store Management, Controlling - Verkaufspersonal (3 Personen) – Qualifikation: Kundenberatung, Verkaufserfahrung - Social-Media-Betreuung (1 Person) – Qualifikation: Content-Erstellung - Reinigungskraft (1 Person) – Qualifikation: Reinigung Arbeitszeit: 4 Wochen	54-57
Store Management		4		54-57
Marketing		4		54-57
Controlling		4		54-57
Personal		4		54-57

RESSOURCENPLANUNG

Nachbereitungsphase

Abbau & Logistik		1	Sachliche Mittel: • Ware, Transportmittel, Verpackungsmaterial Finanzielle Mittel: • Miete, Gehälter, Logistikkosten Räumliche Mittel: • Ladenfläche Personelle Mittel: • Projektteam (6 Personen) – Qualifikationen: Auswertung, Analysefähigkeit • Abbauhelfer (3 Personen) – Qualifikationen: handwerkliches Geschick Arbeitszeit: 3 Wochen	58
Finanzielle Auswertung	Abbau & Logistik	1		59
Analyse & Learnings	Abbau & Logistik	2		59-60
Weiterverwertung	Finanzielle Auswertung	1		60

Engpässe:

Bei der Analyse der Ressourcenplanung wurden zwei potenzielle Engpässe identifiziert. Erstens bindet die Marketingaufgabe über 25 Wochen kontinuierlich die Social-Media-Betreuung, was bei Ausfall oder Überlastung dieser Person zu Lücken in der Außenkommunikation führen kann. Zweitens stellt die Aufbauphase mit nur einer Woche einen kritischen Engpass dar, da in diesem Zeitraum das gesamte Projektteam sowie die Aufbauhelfer gleichzeitig und koordiniert arbeiten müssen.

Lösungsszenarien:

Um den Engpass im Bereich Marketing zu minimieren, wird frühzeitig ein detaillierter Redaktionsplan erstellt, der eine strukturierte und planbare Content-Erstellung ermöglicht. Zusätzlich wird eine Vertretungsperson eingeplant, die bei Ausfall der Social-Media-Betreuung einspringen kann. Für die Aufbauphase wird die Anzahl der Aufbauhelfer bei Bedarf kurzfristig erhöht, um die Einrichtung des Stores innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens sicherzustellen.

KOSTENPLANUNG - SOLL

Indikation								
Monat 4								
Jahr 2026								
01.04.26 30.04.26								
#	Name	Category	Start Date	End Date	Amount Brutto	Taxes & Duties	Amount Netto	Comment
1	Verkaufsausstattung	Auszahlungen	01.04.2027	01.04.2027	4.000 €		4.000 €	einmalig
2	Technik (Kasse, Kartenlesegeraet, WLAN, Beleuchtung)	Auszahlungen	01.04.2027	01.04.2027	2.500 €		2.500 €	einmalig
3	Branding & Dekoration	Auszahlungen	01.04.2027	01.04.2027	2.000 €		2.000 €	einmalig
4	Transport & Aufbaumaterial	Auszahlungen	01.04.2027	01.04.2027	1.500 €		1.500 €	einmalig
5	Marketing (Launch-Kampagne, Sachkosten)	Auszahlungen	01.04.2027	01.04.2027	3.000 €		3.000 €	einmalig
6	Kautiön (2 Monatsmieten)	Auszahlungen	01.04.2027	01.04.2027	12.000 €		12.000 €	einmalig
7	Personalkosten Projektteam - Anlaufmonat (anteilig, ab 15.4.)	Auszahlungen	01.04.2026	01.04.2026	16.335 €		16.335 €	einmalig; anteiliger April 2026 (16 von 30 Tagen)
8	Personalkosten Projektteam - Vollmonate (6 Pers.)	Auszahlungen	01.05.2026	01.05.2027	32.670 €		32.670 €	monatlich, 13 volle Monate (Mai 2026 - Mai 2027); Bruttolohn + ca. 20%AG-Sozialabgaben
9	Personalkosten Projektteam - Abschlussmonat (anteilig, bis 9.6.)	Auszahlungen	01.06.2027	01.06.2027	9.801 €		9.801 €	einmalig; anteiliger Juni 2027 (9 von 30 Tagen)
10	Kaltniete Store	Auszahlungen	01.04.2027	01.05.2027	4.500 €		4.500 €	monatlich, 2 Monate (Aufbau+Durchfuehrung+ Abbau, 6 Wochen gesamt)
11	Nebenkosten Store	Auszahlungen	01.04.2027	01.05.2027	540 €		540 €	monatlich, 2 Monate
12	Versicherung Store	Auszahlungen	01.04.2027	01.05.2027	150 €		150 €	monatlich, 2 Monate
13	Verkaufspersonal (Beratung, Verkauf, Kasse)	Auszahlungen	01.04.2027	01.05.2027	3.155 €		3.155 €	monatlich, 2 Monate; 3 Pers. a 14,60EUR/h + 20% Abgaben
14	Auf-/Abbauhelfer*innen	Auszahlungen	01.04.2027	01.05.2027	1.680 €		1.680 €	monatlich, 2 Monate; 4 Pers. a 14,60EUR/h + 20% Abgaben
15	Reinigungskraft	Auszahlungen	01.04.2027	01.05.2027	535 €		535 €	monatlich, 2 Monate; Minijob-Basis
16	Social-Media-Betreuung	Auszahlungen	01.04.2027	01.05.2027	480 €		480 €	monatlich, 2 Monate; Werkstudent*in, 14,60EUR/h
17	Startbudget vom Unternehmen - Tranche 1 (Projektstart)	Einzahlungen	01.04.2026	01.04.2026	305.000 €		305.000 €	einmalig; deckt Team-Gehaelter April 2026 - Dezember 2026
18	Umsatz Pop-up Store	Einzahlungen	01.04.2027	01.05.2027	22.500 €		22.500 €	monatlich, 2 Monate; Ziel 45.000EUR gesamt (1.500 Besucher x 30% Kaufquote x 100EUR Bon)
19	Startbudget vom Unternehmen - Tranche 2 (Start Kernvorbereitung)	Einzahlungen	01.01.2027	01.01.2027	100.000 €		100.000 €	einmalig; deckt Team-Gehaelter Januar - Februar 2027
20	Startbudget vom Unternehmen - Tranche 3 (vor Store-Eroeffnung)	Einzahlungen	01.03.2027	01.03.2027	71.111 €		71.111 €	einmalig; deckt restliche Team-Gehaelter, einmalige Store-Kosten (inkl. Kautiön) und laufende Store-Kosten
21	Risikopuffer	Auszahlungen	01.04.2026	01.04.2026	25.000 €		25.000 €	einmalig; ca. 5% der Gesamtkosten als Risikoreserve, siehe Risikoliste
22	Kautiönsmueckerstattung	Einzahlungen	01.06.2027	01.06.2027	12.000 €		12.000 €	einmalig; Rueckzahlung der Kautiön nach Store-Schliessung
23	Umsatzsteuer-Abfuehrung ans Finanzamt (19%)	Auszahlungen	01.06.2027	01.06.2027	7.185 €		7.185 €	einmalig; 19% USt auf Umsatz von 45.000EUR (45.000 x 19/119)




KOSTENPLANUNG - SOLL

Liquidität Untergrenze	2.305 €							
Reichweite [M]	#NV							
Reichweite [J]	#NV							
Datum	04.2026	05.2026	06.2026	07.2026	08.2026	09.2026	10.2026	11.2026
Laufzeit Jahre	-0,42	-0,33	-0,25	-0,17	-0,08	0,00	0,08	0,17
Laufzeit Monate	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2
Einzahlungen Plan	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €
Auszahlungen Plan	41.335 €	74.005 €	106.675 €	139.345 €	172.015 €	204.685 €	237.355 €	270.025 €
Monatsüberschuss	263.665 €	- 32.670 €	-32.670 €	-32.670 €	-32.670 €	-32.670 €	-32.670 €	-32.670 €
Soll Differenz	263.665 €	230.995 €	198.325 €	165.655 €	132.985 €	100.315 €	67.645 €	34.975 €
Einnahmen Netto	305.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen	305.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgaben	41.335 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €
Auszahlungen	41.335 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €

Liquidität Untergrenze							
Reichweite [M]							
Reichweite [J]							
Datum	12.2026	01.2027	02.2027	03.2027	04.2027	05.2027	06.2027
Laufzeit Jahre	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75
Laufzeit Monate	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen Plan	305.000 €	405.000 €	405.000 €	476.111 €	498.611 €	521.111 €	533.111 €
Auszahlungen Plan	302.695 €	335.365 €	368.035 €	400.705 €	469.415 €	513.125 €	530.111 €
Monatsüberschuss	-32.670 €	67.330 €	-32.670 €	38.441 €	-46.210 €	-21.210 €	-4.986 €
Soll Differenz	2.305 €	69.635 €	36.965 €	75.406 €	29.196 €	7.986 €	3.000 €
Einnahmen Netto	- €	100.000 €	- €	71.111 €	22.500 €	22.500 €	12.000 €
Einzahlungen	- €	100.000 €	- €	71.111 €	22.500 €	22.500 €	12.000 €
Ausgaben	32.670 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €	68.710 €	43.710 €	16.986 €
Auszahlungen	32.670 €	32.670 €	32.670 €	32.670 €	68.710 €	43.710 €	16.986 €

→ Die Ist-Kosten werden während der Projektdurchführung laufend erfasst und mit den Soll-Kosten verglichen, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen.

KOSTENPLANUNG - SOLL

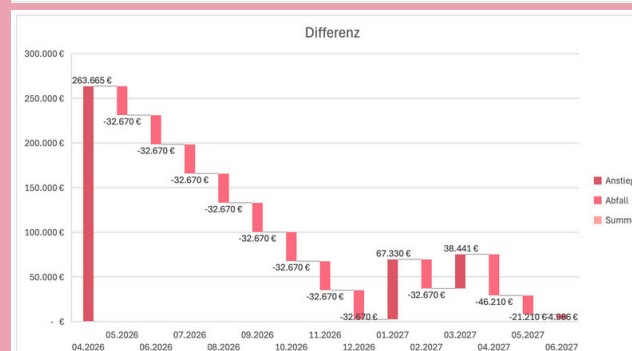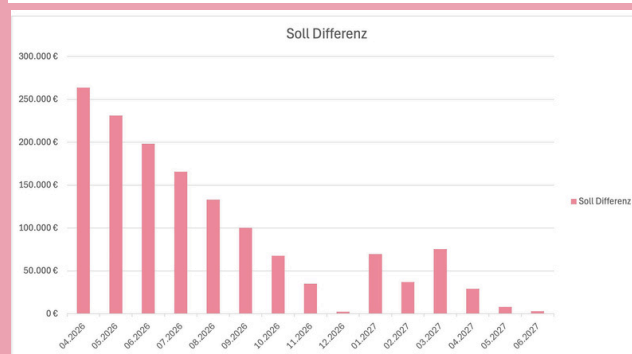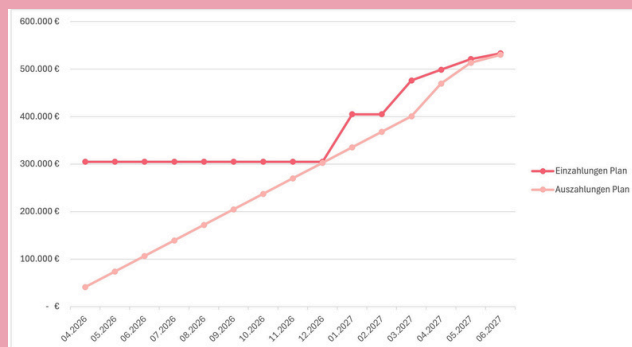



LOOP STUDIO

F A S H I O N
